


PHASE 1

TRAVAUX


- 1) ABAISSEMENT DU PLAN D'EAU A LA COTE 314.50 m s.m. (DUREE ENV. 4 SEMAINES)
- 2) EXCAVATION DE LA FONDATION DU RIDEAU DE PALPLANCHES A PARTIR DE LA RETENUE A L'AIDE D'UNE BARGE
- 3) MONTAGE ET SCELLEMENT DU RIDEAU DE PALPLANCHES
- 4) REHAUSSEMENT DU PLAN D'EAU (NIV. MAX. D'EXPLOITATION 317.00 m s.m. EN HIVER OU 320.00 m s.m. EN ETE)

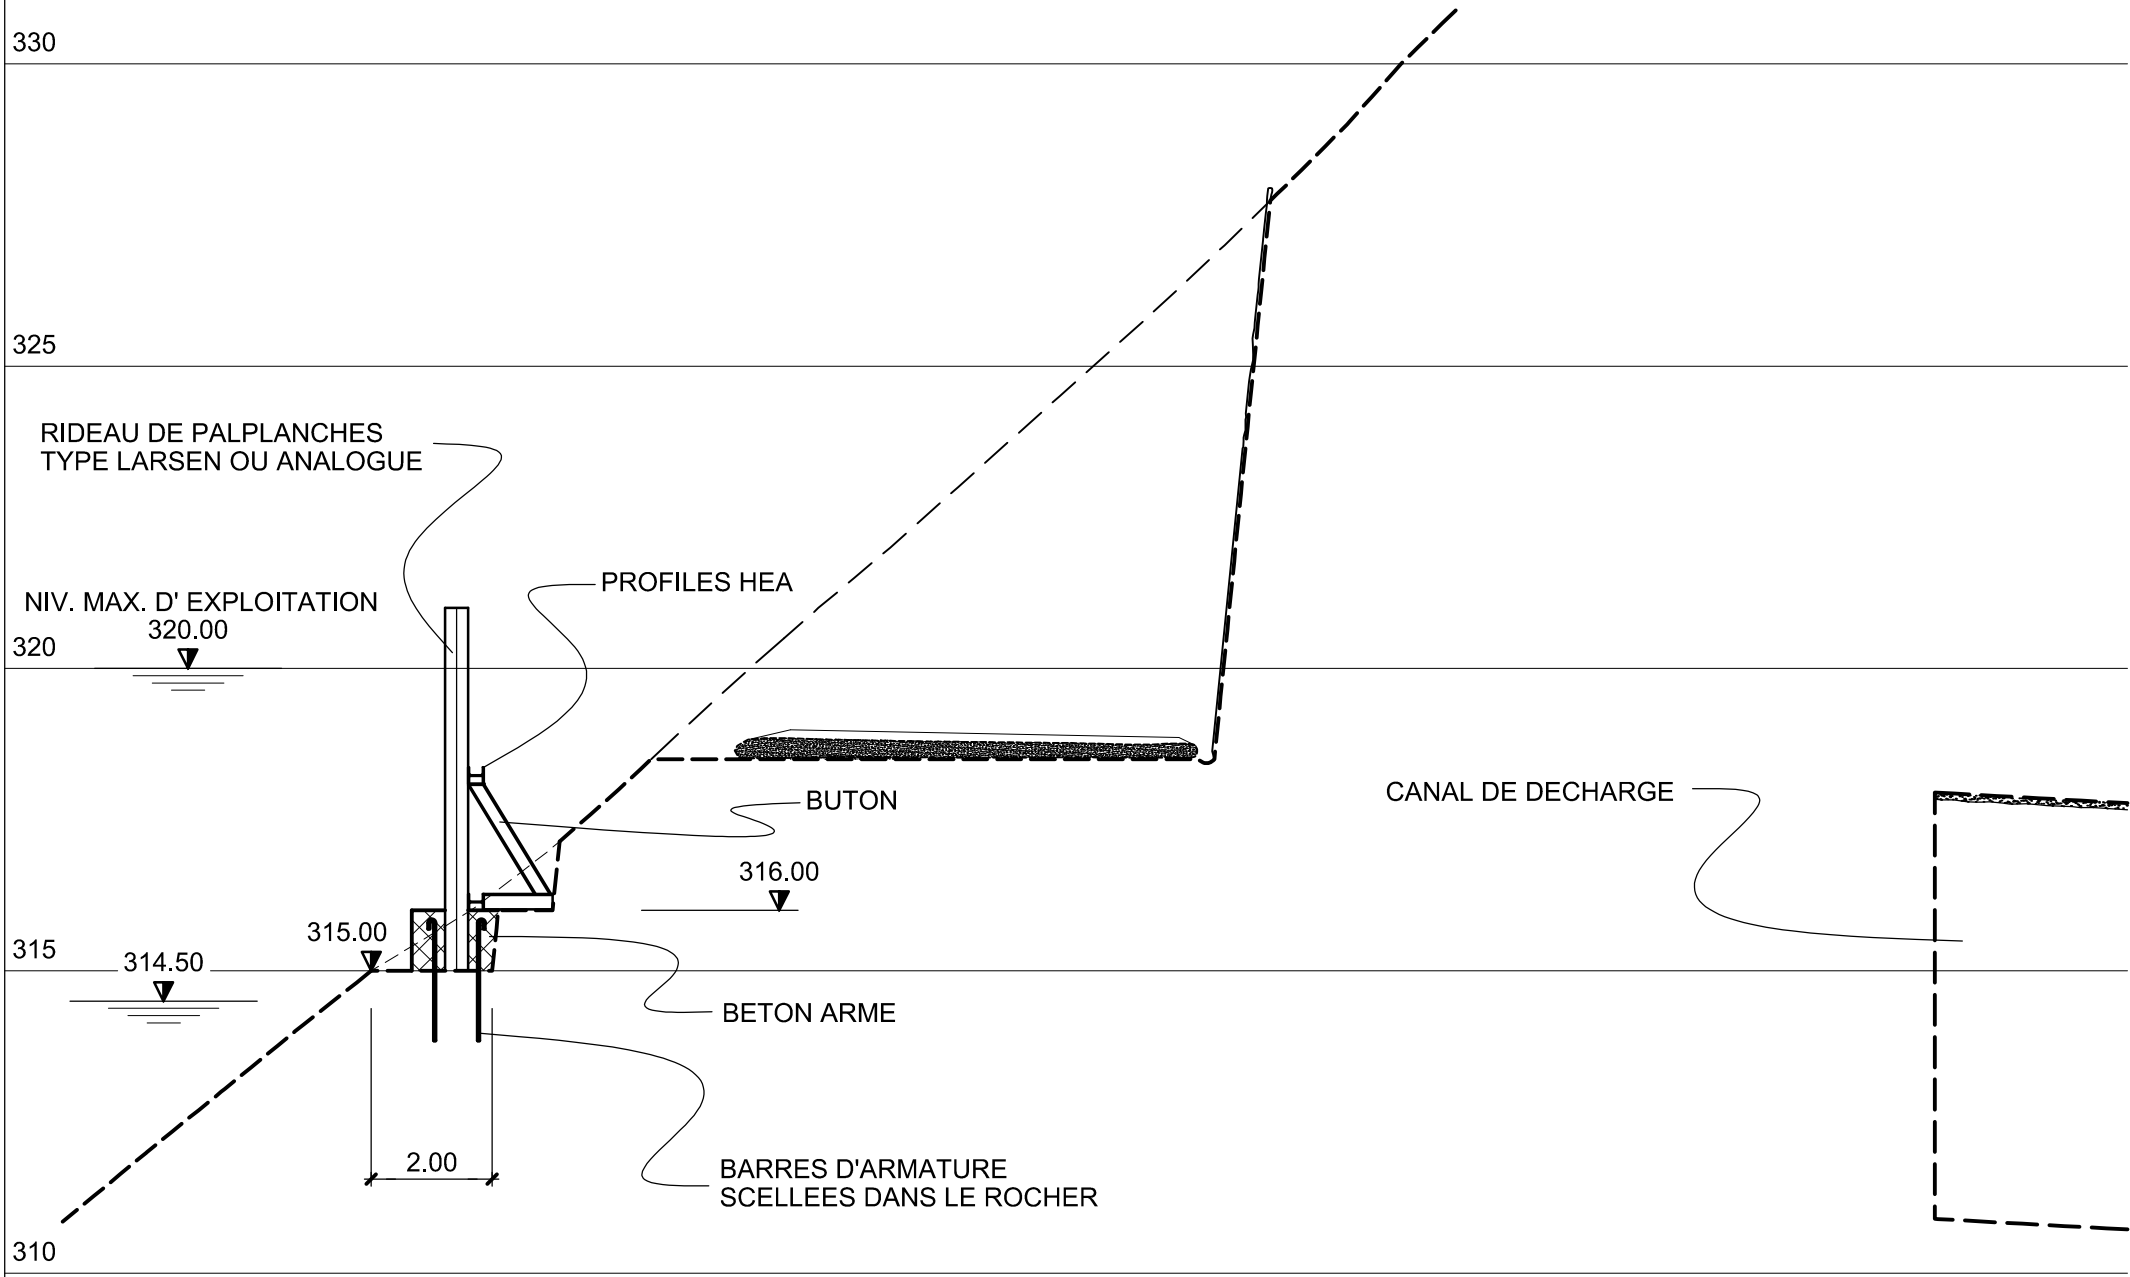

PHASE 2

TRAVAUX


- 1) CREATION D'UNE RAMPE DANS LE CANAL DE DECHARGE
- 2) EXCAVATION DE LA GALERIE PROVISoire VERS LA RETENUE

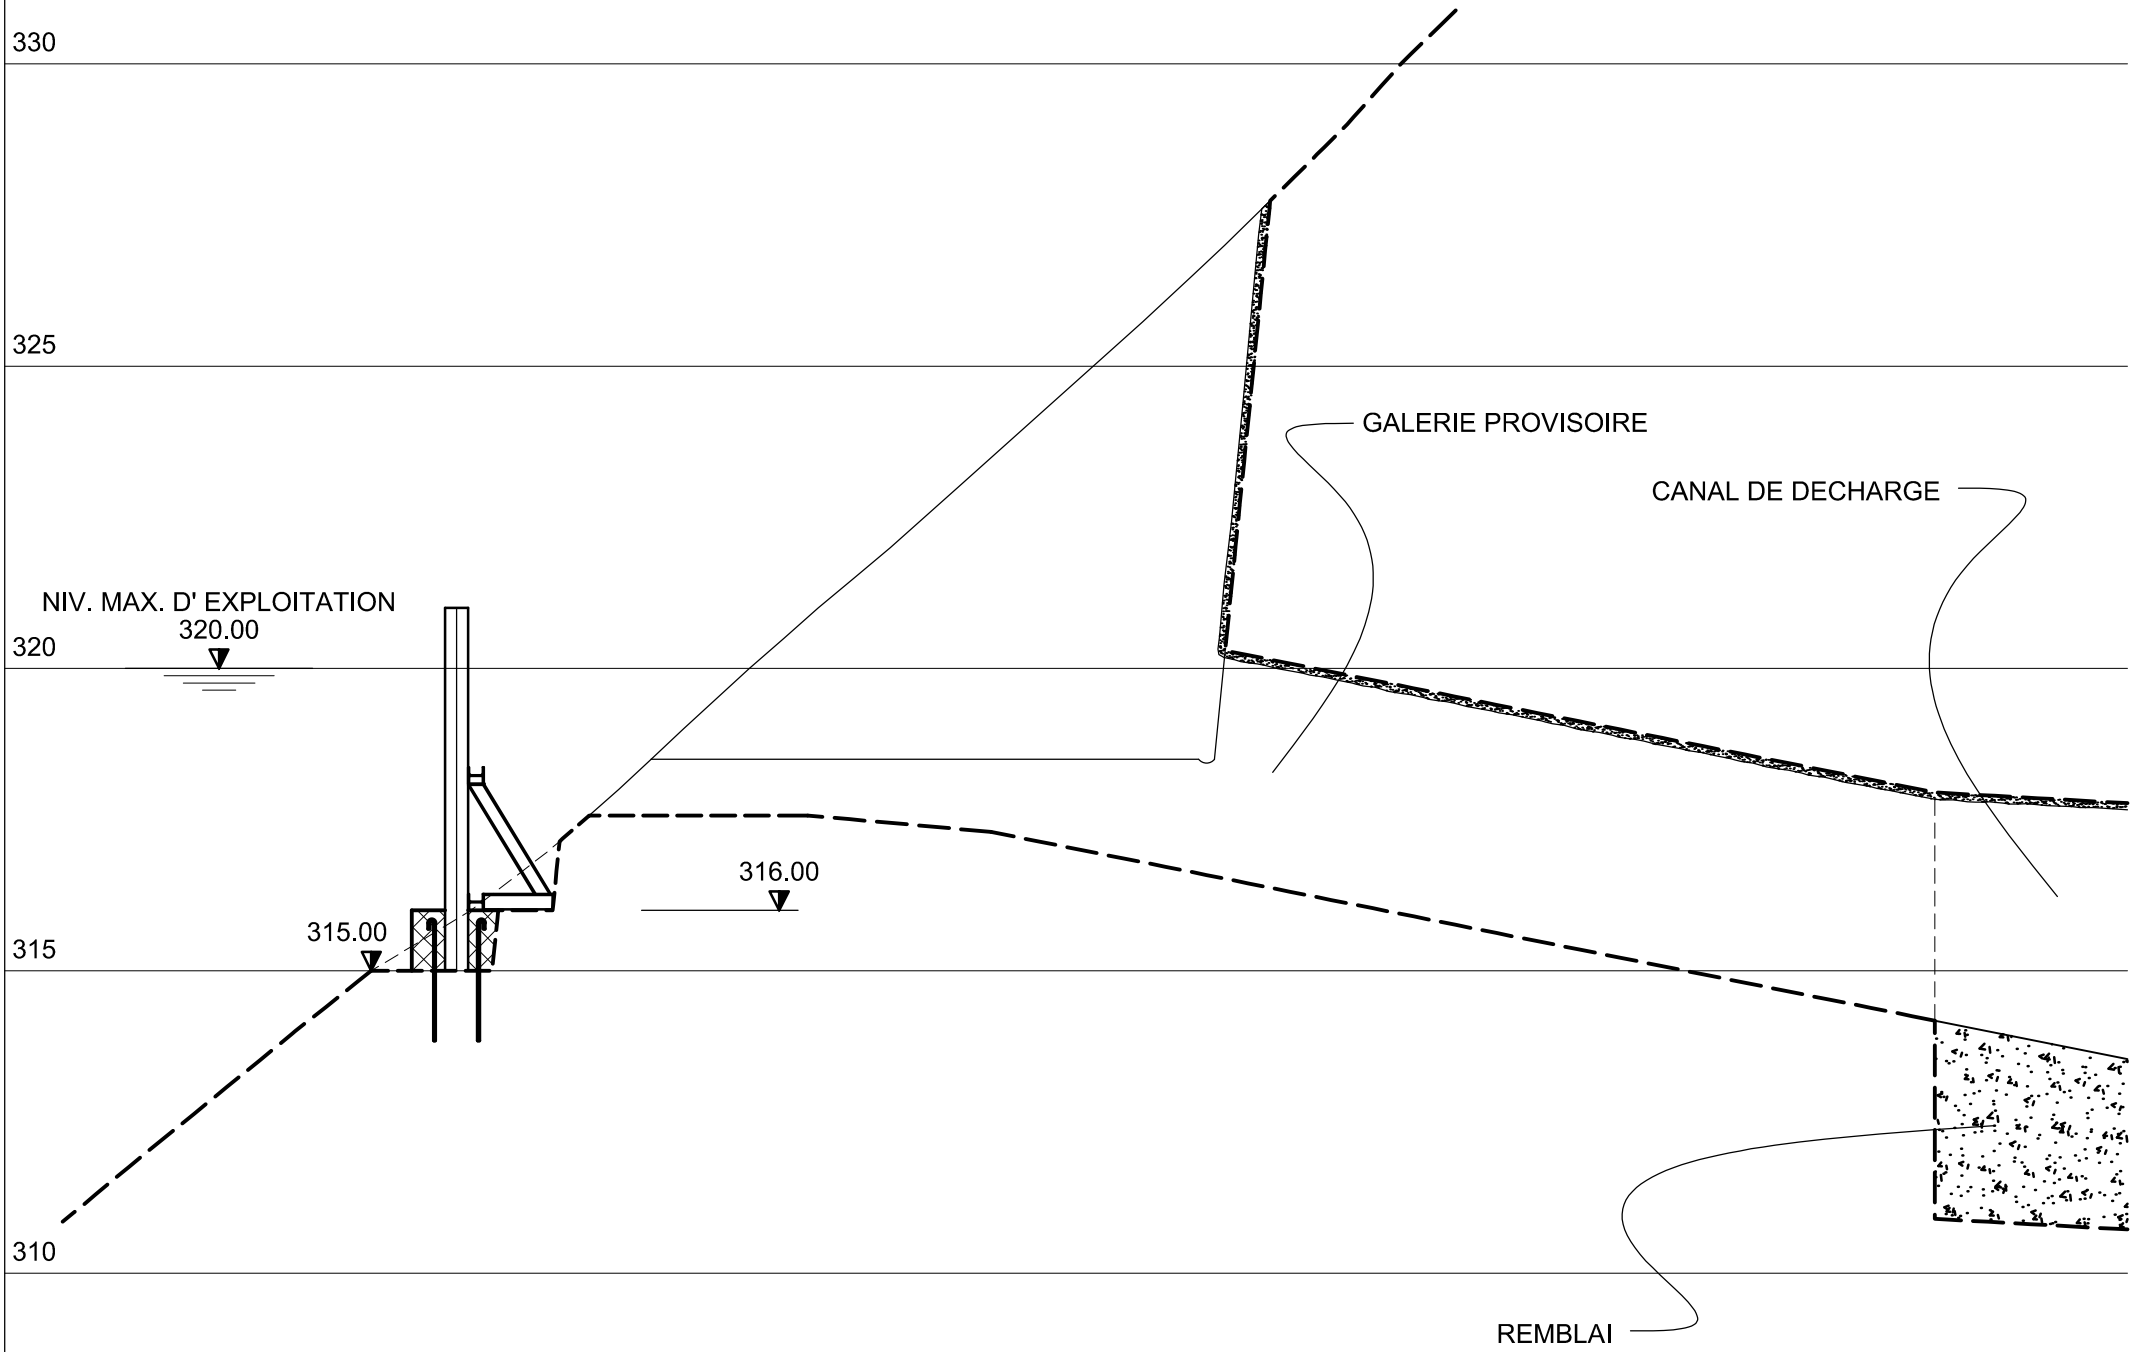

PHASE 3

TRAVAUX


- 1) EXCAVATION A CIEL OUVERT ET STABILISATION DE LA PARTIE SUPERIEURE DE LA BOUCHE DE PRISE

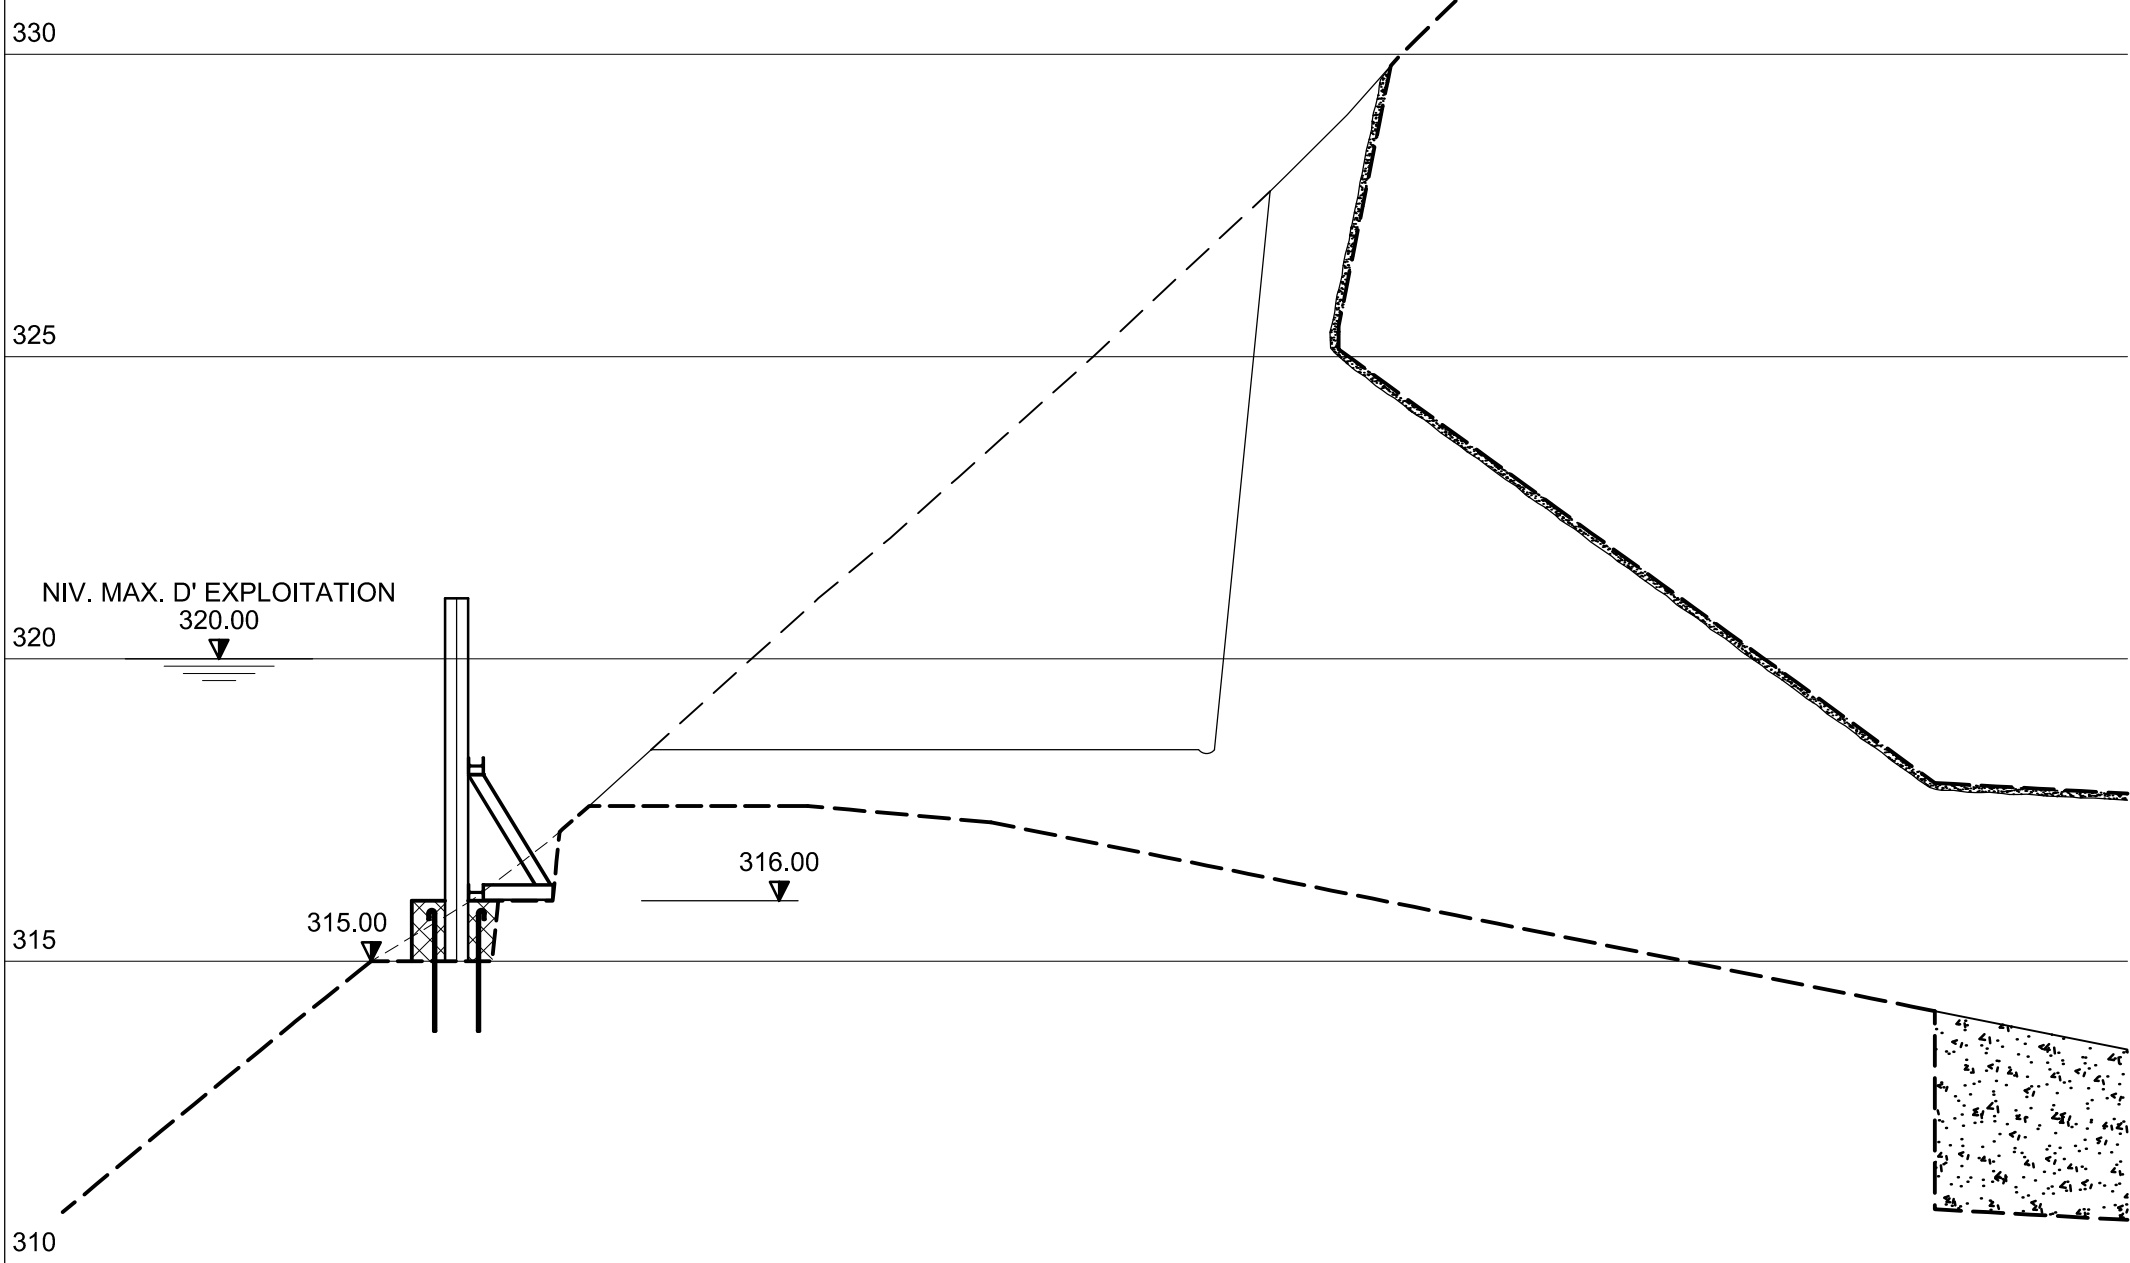


PHASE 4

TRAVAUX

- 1) EXCAVATION A CIEL OUVERT DE LA PARTIE INFERIEURE DE LA BOUCHE DE PRISE
- 2) BETONNAGE DU DEVERSOIR LABYRINTHE
- 3) DEMANTELEMENT DU RIDEAU DE PALPLANCHES EN PERIODE DE BASSES EAUX (1 SEMAINE)

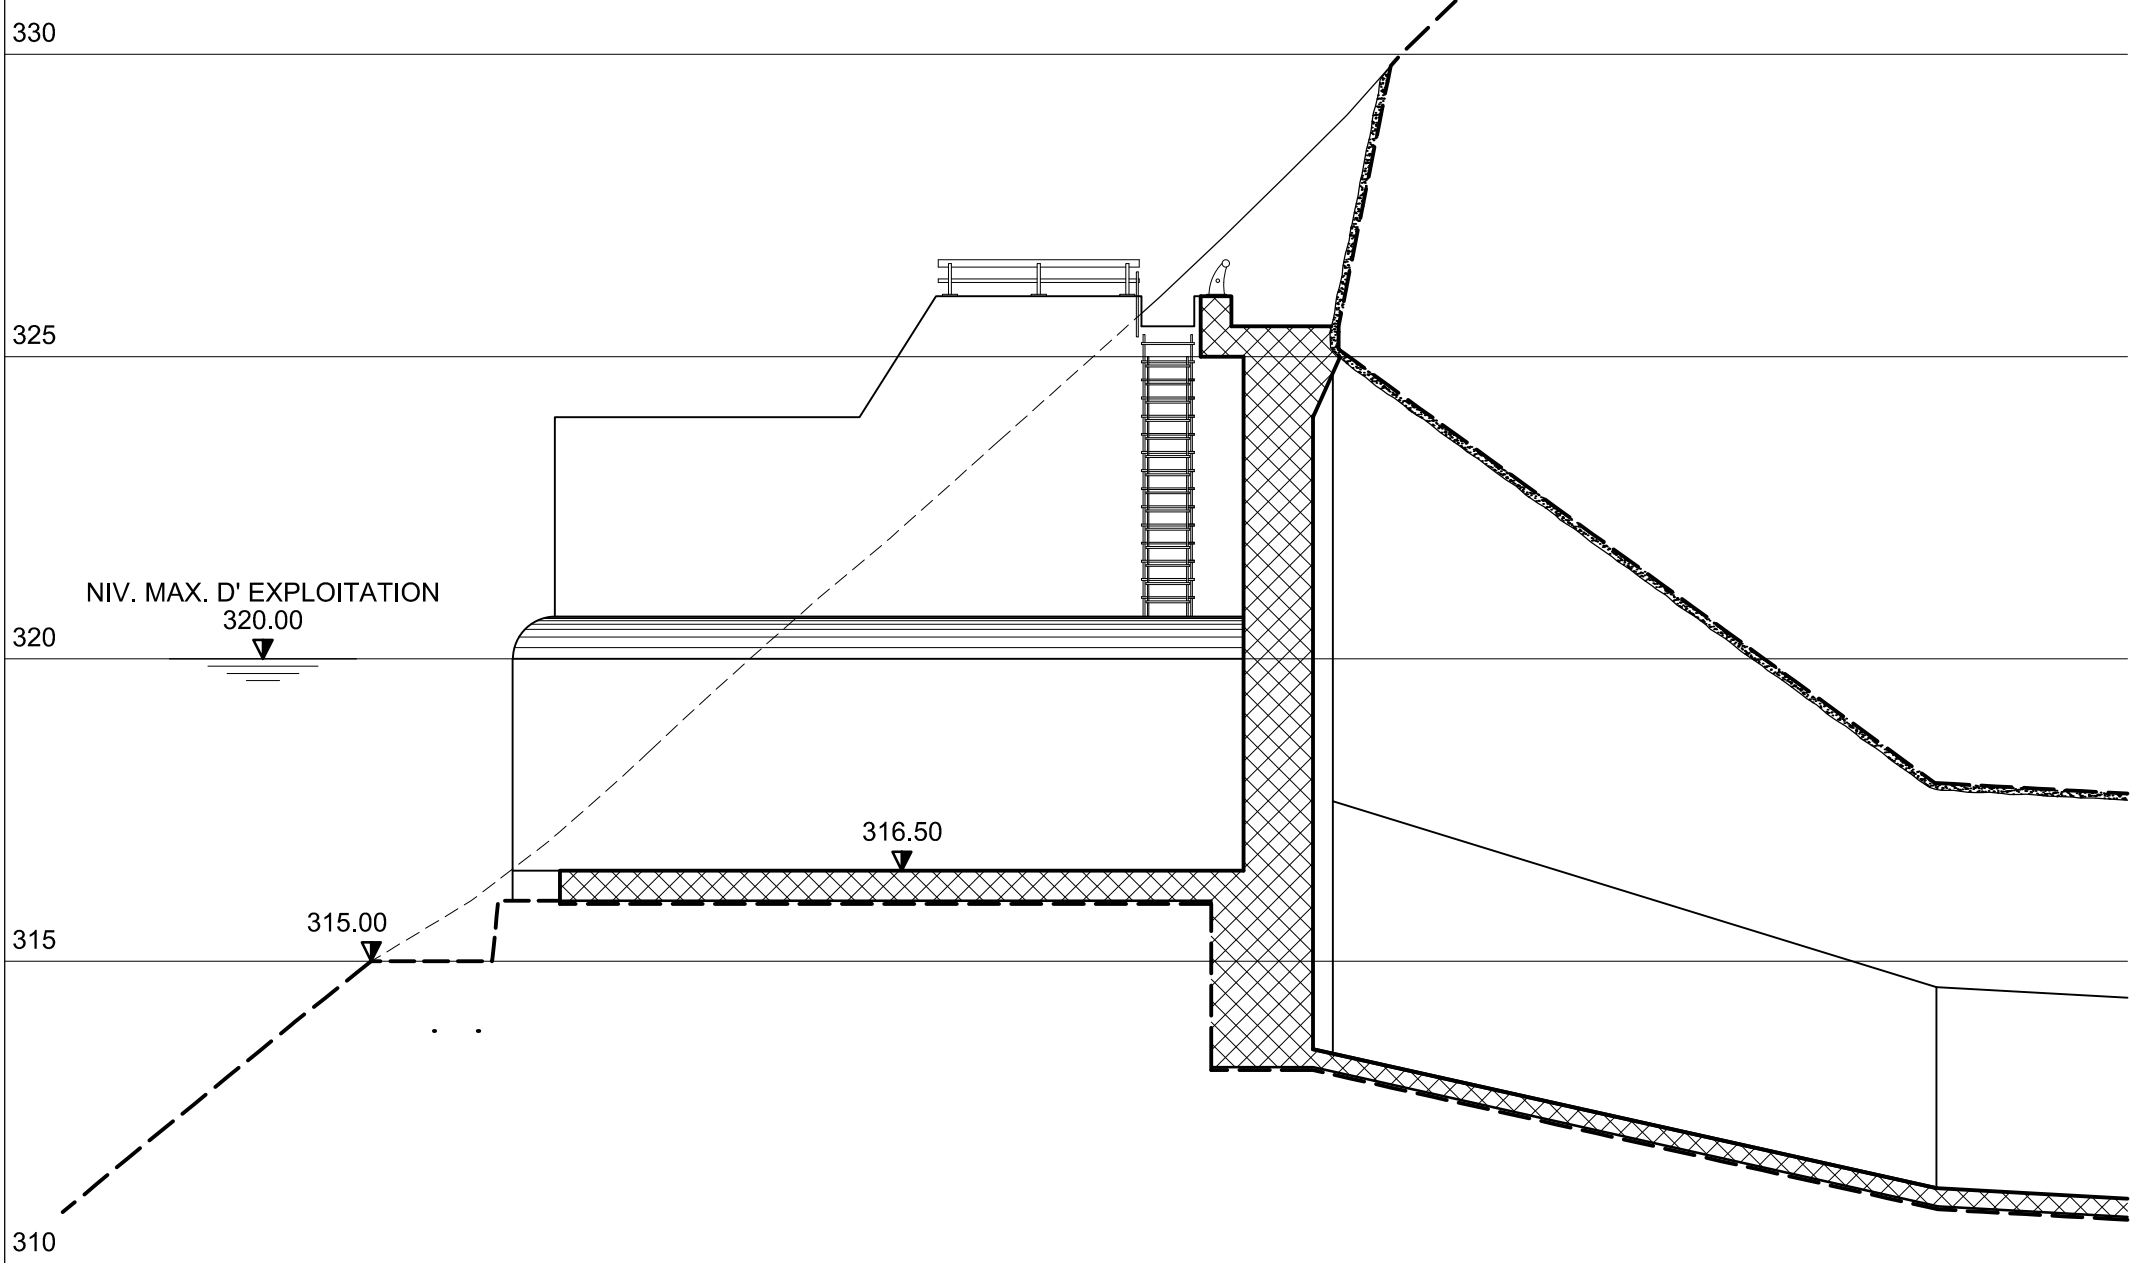

SITUATION

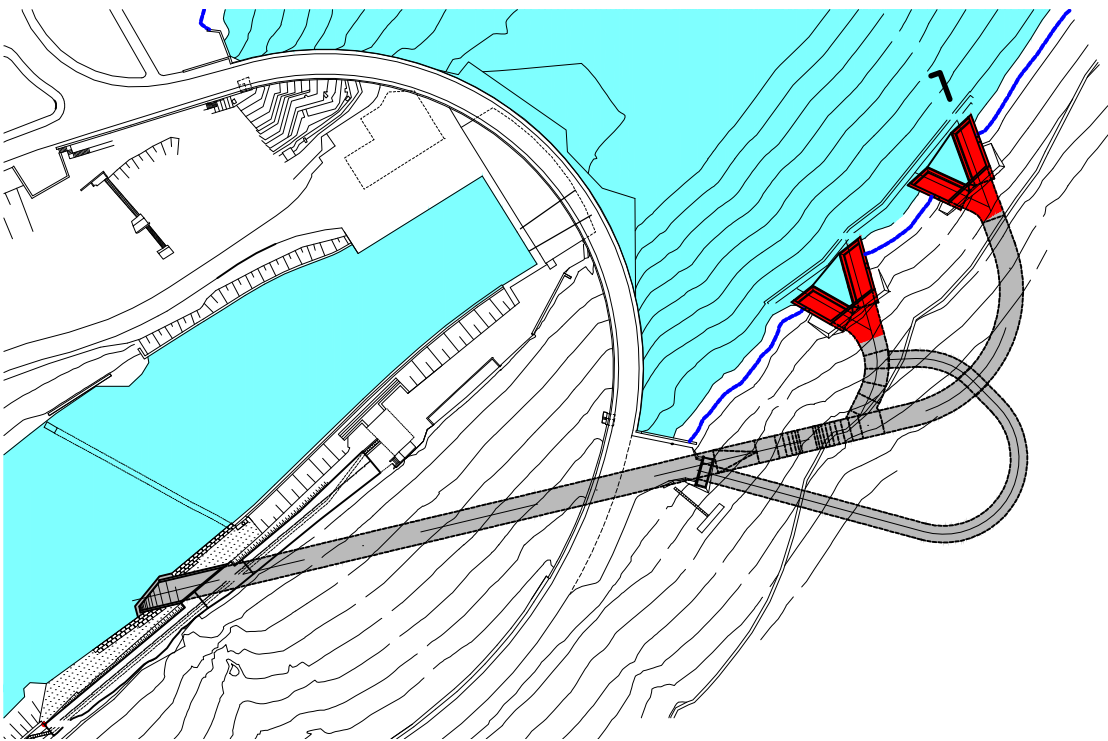


NOTES:

- LES DESSINS SONT ILLUSTRATIFS ET RENDENT COMPTE DE LA SITUATION A LA FIN DE CHAQUE PHASE
- LE RIDEAU DE PALPLANCHES CONTRIBUE EGALEMENT A PROTEGER LA RETENUE CONTRE TOUT RISQUE DE POLLUTION PENDANT LE CHANTIER
- UNE STABILISATION DU FRONT AVEC BETON PROJETE ET BOULONS SE FERA SI NECESSAIRE

REFERENCE:

- DEVERSOIRS LABYRINTHE PHASES PRINCIPALES DES TRAVAUX EN SITUATION VOIR PLAN N.° 48949



	LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG MINISTÈRE DE LA MOBILITÉ ET DES TRAVAUX PUBLICS ADMINISTRATION DES PONT ET CHAUSSÉES				
BARRAGE D'ESCH-SUR-SURE Evacuateur de crue complémentaire OA1158					
SOUSSION					
DEVERSOIRS LABYRINTHE PHASES PRINCIPALES DES TRAVAUX EN COUPE					
		C			
23.05.18	MID	Fel	La	Modifications mineures	A
Date:	Dess.	Verif.	Appr.	Description modification	
10.06.2015	UP	Fel	BF	A1 (84 x 60)	7500.4-P-334A
Date:	Dess.	Verif.	Appr.	Dim. :	Nom fichier
Echelle : 1:125		No. Lo : 7500.4-P-334A		No. 48949	A
